

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 国道57号北側復旧ルート 第6号 平成30年2月 熊本57号災害復旧 二重峠トンネル(大津工区)工事【通信】

現場HP
QRコード



最新情報はこちらへアクセス

【ご挨拶】

年明けは予定通り1月4日から掘削を再開しました。
避難坑は1月10日に1000mを突破し、終盤戦を迎えています。
本坑も1月末に500mを突破し、これから早期貫通への正念場です。
冷え込む日が続いていますが、トンネル掘削作業は寒さにも負けず、昼夜休みなく、安全第一で進めてまいります。インフルエンザ等が流行しておりますので、健康に十分留意され、引き続きご協力のほどをよろしくお願いいたします。

【今後の予定】


- 本坑では2月からインバート施工を開始しました。インバート施工を順次進め、4月には覆工コンクリートの施工を開始予定です。
- 避難坑、本坑ともに、引き続きトンネル掘削を昼夜連続作業で一日も早い貫通に向けて掘り進めていきます。



【トンネル掘削進捗状況】

平成30年1月末現在

	設計延長	1月掘削実績	12月掘削実績	掘削月進	進捗率
避難坑	1653.0 m	1101.1 m	952.1 m	149.0 m	66.6 %
本坑	1659.0 m	512.4 m	401.2 m	111.2 m	30.9 %

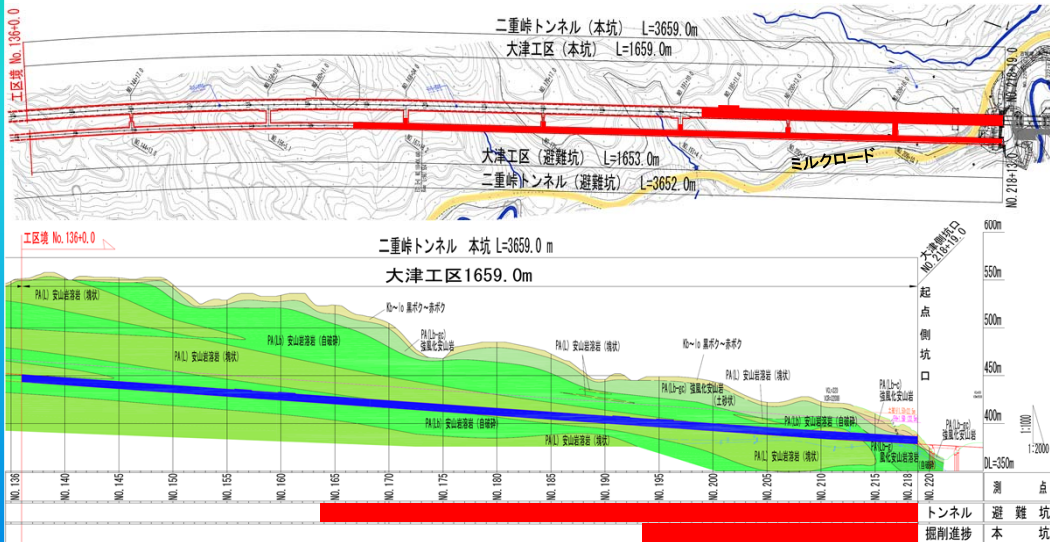

【施工状況写真】



熊本地震により通行不能となっている国道57号の復旧のため、1日も早い開通に向けて全力で取り組んでおります。何かお気づきの点がありましたら、事務所までご連絡下さい。

清水・福田・松下地域維持型建設共同企業体
 清水建設㈱ 福岡田組 松下組
 ■現場事務所住所：熊本県菊池郡大津町吹田1223-1 ■電話番号：096-273-8571
 作業所スローガン

決意・創意・熱意で、**熊本**の未来に誇れるトンネルを。
