

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 国道57号北側復旧ルート 第10号 平成30年6月 熊本57号災害復旧 二重峠トンネル(大津工区)工事【通信】



【ご挨拶】

5月10日から計画どおり本坑2箇所での掘削を開始しました。掘削進捗をより一層加速させて、掘削完了に向けて掘り進めていきます。また5月22日には天候にも恵まれ、本坑坑門工の打設を無事に完了することができました。今後は覆工コンクリート打設を本格的に始動します。梅雨に入り、天候の悪い日が続くと予想されますが、作業所一丸となり、雨にも熱中症にも負けず、工事を進めていきますので、引き続きご協力のほどをよろしくお願いいたします。

【今後の予定】


- 本坑①と本坑②の到達は、7月頃を予定しています。
- 本坑覆工コンクリートの2BL打設を6月6日に実施し、本格的に施工を開始します。
- 本坑インバートは順次施工を進めていきます。
- 本坑2箇所でのトンネル掘削を昼夜連続作業で一日も早い貫通に向けて掘り進めていきます。



【トンネル掘削進捗状況】

平成30年5月末現在

	設計延長	4月掘削実績	3月掘削実績	掘削月進	進捗率
避難坑	1653.0 m	1552.9 m	1552.9 m	0.0 m	93.9 %
本坑	1659.0 m	1079.7 m	900.1 m	179.6 m	65.1 %

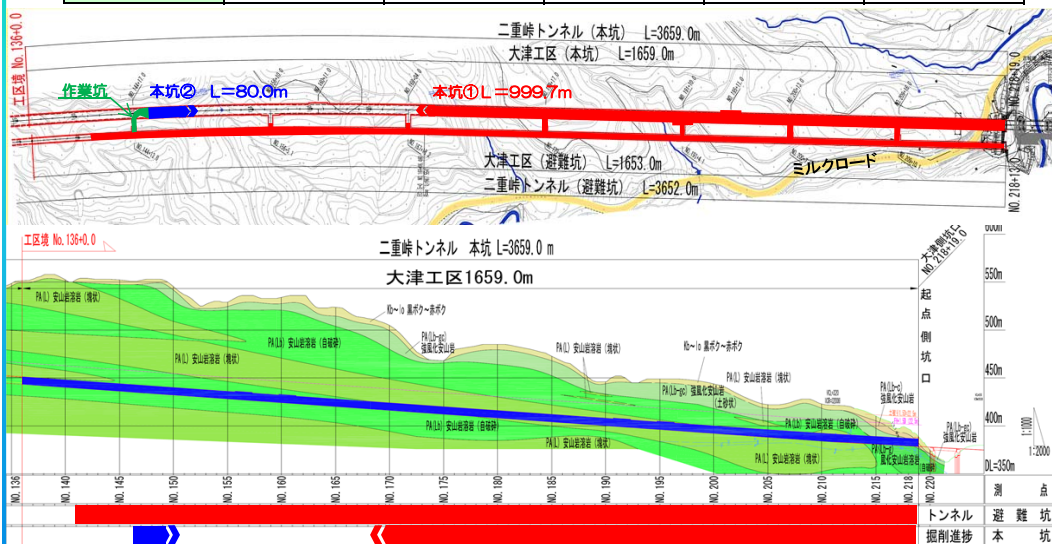

【施工状況写真】




本坑①吹付コンクリート状況



本坑②鏡吹付コンクリート状況



本坑坑門工打設状況

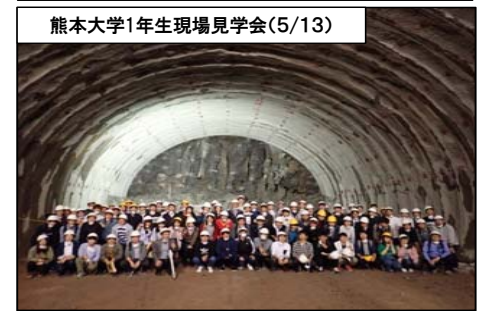

熊本大学1年生現場見学会(5/13)

熊本地震により通行不能となっている国道57号の復旧のため、1日も早い開通に向けて全力で取り組んでおります。何かお気づきの点がありましたら、事務所までご連絡下さい。

清水・福田・松下地域維持型建設共同企業体
 ■現場事務所住所：熊本県菊池郡大津町吹田1223-1 ■電話番号：096-273-8571
 作業所スローガン

決意・創意・熱意で、**熊本**の未来に誇れるトンネルを。
